

# Alinhamento de Melhorias e Estimativa

SmartDocPlan: confirmação do entendimento das melhorias do fluxo atual em homologação e previsão de execução por etapas.

## Ficha do projeto

|                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projeto</b><br>SmartDocPlan                                                                | <b>Cliente final</b><br>SmartDocPlan                                                              | <b>Responsável Atenza</b><br>Ewerton Gomes Almeida                                             |
| <b>Responsável pelo cliente / ponto focal</b><br>Equipe SmartDocPlan                          | <b>Versão do documento</b><br>v1.0                                                                | <b>Data</b><br>25/08/2026                                                                      |
| <b>Status geral</b><br>Em homologação – ajustes em análise                                    | <b>Ambiente</b><br>Homologação                                                                    | <b>Próxima ação</b><br>Validar entendimento e premissas                                        |
| <b>Decisão aguardada</b><br>Confirmação das regras de negócio críticas                        | <b>Entregue</b><br>Análise das melhorias solicitadas                                              | <b>Pendente</b><br>Validação do cliente e priorização                                          |
| <b>Risco</b><br>Decisões pendentes podem alterar a previsão                                   | <b>Depende de aprovação</b><br>Sim, para início das etapas correspondentes                        |                                                                                                |
| <b>STATUS</b>                                                                                 | <b>PRÓXIMA AÇÃO</b>                                                                               | <b>DECISÃO AGUARDADA</b>                                                                       |
| <b>Em homologação. O fluxo atual será aprimorado sem reposicioná-lo como um novo projeto.</b> | Validar com a SmartDocPlan as regras que influenciam a ordem de execução e o prazo das melhorias. | Confirmar os cinco temas listados neste documento para manter a previsão global de 16 semanas. |


## 1. Resumo executivo

A Atenza consolidou o entendimento das melhorias apresentadas para a versão atual do SmartDocPlan, que permanece em homologação. O objetivo é aprimorar o fluxo já existente de solicitações, documentos e dossiê, além de incluir as rotinas de férias e de atestados/afastamentos como evoluções integradas à plataforma.

## 2. Situação atual e entendimento

| Frente                        | Status                | Entendimento Atenza                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo atual de solicitações   | Parcialmente aderente | Já existe base de solicitações, documentos e dossiê; o ajuste é ampliar as regras automáticas e o histórico operacional. |
| Matriz legal e requisitos     | Parcialmente aderente | Já há requisitos por função; a evolução passa a considerar também processo e frente/local, com origem explicável.        |
| Férias                        | Evolução prevista     | Será incluído como módulo de gestão com calendário, programação, alertas, filtros e histórico.                           |
| Atestados e afastamentos      | Evolução prevista     | Será incluído como módulo com controle de retorno, anexos, histórico e permissões adequadas aos dados sensíveis.         |
| Notificações, BI e relatórios | Parcialmente aderente | A central de notificações já existe; os indicadores, filtros e detalhamentos serão ampliados com as novas rotinas.       |

## 3. Fluxos de evolução

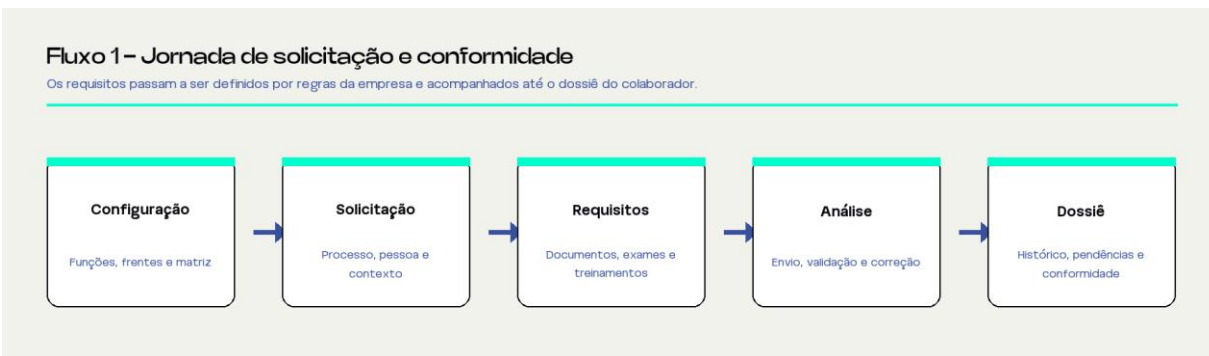

## Fluxo 2 – Rotinas trabalhistas integradas

Férias, atestados e afastamentos passam a alimentar os alertas, o histórico e os indicadores da plataforma.



## 4. Melhorias priorizadas

|   |                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aprimorar frentes/locais, histórico de função e local do colaborador e motor de requisitos por processo, função e frente/local.                                          |
| 2 | Aprimorar solicitações e dossiê: requisitos automáticos, origem explicável, fotografia da regra aplicada, pendências, documentos, histórico e conformidade transparente. |
| 3 | Incluir gestão de férias: períodos aquisitivo e concessivo, programação, aprovação, calendário, alertas, filtros e histórico por colaborador.                            |
| 4 | Incluir atestados e afastamentos: registro, anexos, período, retorno previsto, pendências, histórico e permissões reforçadas para dados sensíveis.                       |
| 5 | Ampliar BI, alertas e relatórios com indicadores rastreáveis e filtros por empresa, função, frente/local, período e status.                                              |

## 5. Confirmações necessárias e próximos passos

| Pendência                | Responsável           | Próxima ação                                                                                  | Prazo                         |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Frente/local de trabalho | SmartDocPlan          | Confirmar se frente, obra, unidade e contrato são uma única entidade ou cadastros diferentes. | Até 5 dias úteis após o envio |
| Matriz de requisitos     | SmartDocPlan / Atenza | Definir se a regra será por processo, função, frente/local ou combinação desses critérios.    | Até 5 dias úteis após o envio |
| Conformidade do dossiê   | SmartDocPlan / Atenza | Aprovar percentual, pesos e tratamento de itens pendentes ou vencidos.                        | Até o início da Etapa 2       |
| Férias                   | SmartDocPlan          | Definir aprovação e se haverá cálculo de saldo legal ou apenas registro de dados validados.   | Até o início da Etapa 3       |
| Dados de saúde           | SmartDocPlan / Atenza | Definir dados permitidos e perfis autorizados a visualizar atestados e afastamentos.          | Até o início da Etapa 4       |

## 6. Previsão de prazo

A previsão para as melhorias mapeadas é de 16 semanas, contadas após a confirmação do entendimento e das decisões críticas. A execução será organizada em: Etapa 1 – regras e vínculos (3 semanas); Etapa 2 – solicitações, dossiê e conformidade (3 semanas); Etapa 3 – férias (4 semanas); Etapa 4 – atestados e afastamentos (3 semanas); e Etapa 5 – BI, alertas e relatórios (3 semanas). Integrações externas, cálculos financeiros de férias ou novas demandas serão avaliados separadamente caso sejam solicitados.

Solicita-se a confirmação de que o entendimento acima representa a necessidade da SmartDocPlan e o retorno consolidado sobre as decisões listadas. Com essa validação, a Atenza organizará o backlog executivo e seguirá com a primeira etapa priorizada para a versão em homologação.



## Histórico de versões

| Versão | Data       | Responsável           | Descrição                                                                                                |
|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0   | 25/08/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial para confirmação das melhorias do fluxo atual em homologação e da estimativa por etapas. |
